项目进度计划

数据备份软件（DataBackup）

组长: 王科瑾
学号: 待填写

目录

项目进度计划.....1

1. 关键日期.....1

2. 甘特图.....2

3. 周计划.....3

4. 当前状态.....4

5. 风险与缓冲.....5

6. 变更记录.....6

项目进度计划


基准日：2026-10-16（第 5 周周五）。课次日期按"每周一上课"推算⚠，以实际课表为准；课表确认后更新本表与甘特图。 维护规则：任务状态以 `../roadmap.md` 为准；每完成一个里程碑或计划变动时更新本文 §4 状态表与 §6 变更记录。PDF 只在项目最后（M9-2）生成。 **开发节奏（2026-10-16 调整）**：开发全部由 agent 执行，W3→W4→W5 压缩为 10-16 晚 ~ 10-18 的两日冲刺；之后代码冻结，第 6~9 周只剩人工任务与提交窗口。课程节点与提交截止不变。

1. 关键日期

日期	事件
2026-10-16 晚 ~ 10-17	**agent 冲刺上半段**：W3 集成泳道六任务串行（M2-5→M3-1→M3-2→M4-2→M5-5→M6-3）
2026-10-18	**agent 冲刺下半段**：C3 联调 → C4 打包 + M8 测试证据 + M9-1 文档定稿并行 → M9-2 一次性 PDF → M9-3 PPT / M9-4 视频脚本；**功能**

日期	事件
	冻结
2026-10-19（周一）	第 6 次课；代码已冻结，课上可演示真实备份/还原
2026-10-26（周一）	第 7 次课
2026-11-02（周一）	第 8 次课
2026-11-09（周一）	第 9 次课
2026-11-12（周四）	提交物最终核对（PDF、视频链接、提交包）
2026-11-13（周五）	提交（预留 2 个工作日缓冲）
2026-11-16（周一）	**第 10 次课：提交截止 + 答辩 + 演示**

2. 甘特图

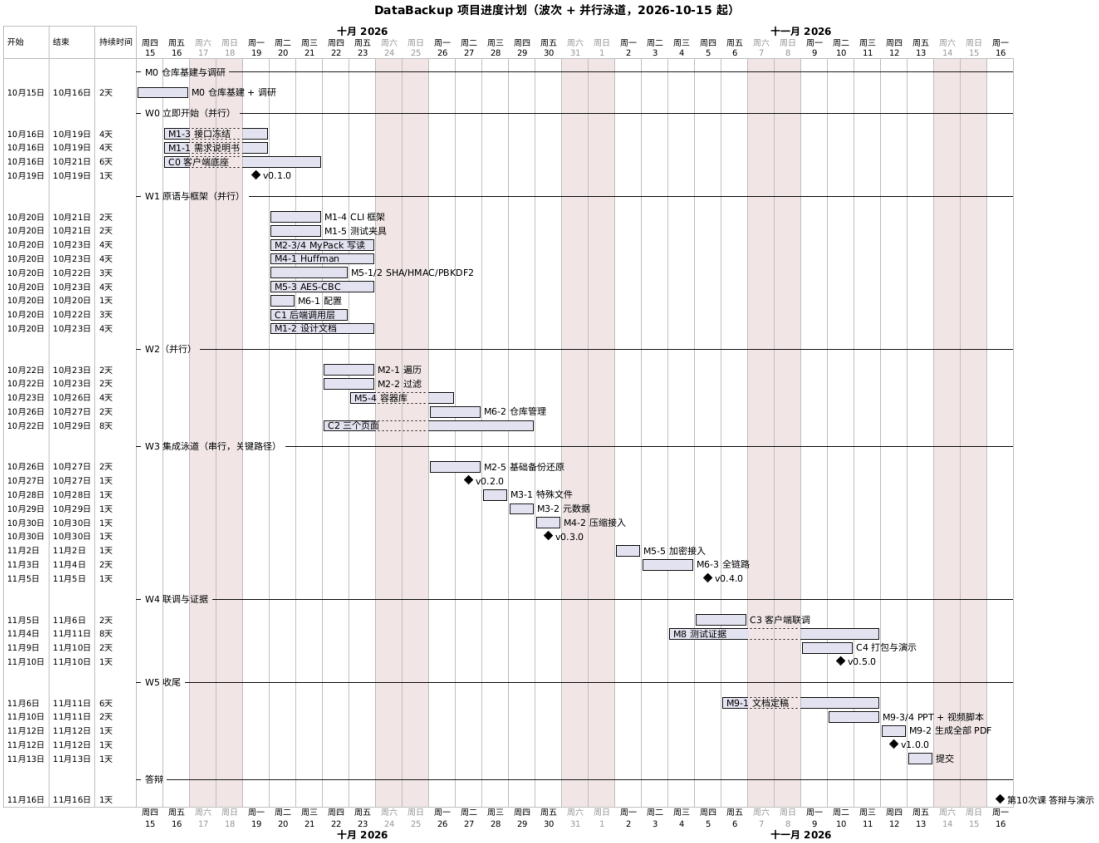

（源文件 `diagrams/schedule-gantt.puml`，由 `bash scripts/docker.sh docs` 渲染。）

3. 周计划

任务波次与并行泳道的定义见 `../roadmap.md` §1。

周	日期	课程主题	波次	目标产出	版本
第 5 周	10-12 ~ 10-18	需求设计与程序框架	M0 + W0 + W1 + W2 ☒；**W3 → W4 → W5 两日冲刺（10-16 晚 ~ 10-18）**	全部功能代码、WSL 打包验证、测试证据、四份交付文档与全部 PDF、PPT、视频脚本	v0.1.0（需求+设计+框架已齐，可随时打）→ v1.0.0 功能冻结 10-18
第 6~9 周	10-19 ~ 11-15	打包解包 / 压缩解压 / 加密解密与系统集成 / 软件发布与项目收尾	缓冲期（代码已冻结）	只做人工任务：H2 证书、H3 看板截图、H9 签到、H5 StarUML 复核、H6 视频录制、H7 AI 截图、H8 通读彩排；需要时打 v1.0.0	—
第 10 周	11-16	项目答辩与成果展示	—	11-13 前组装提交包（源码 + 可执行程序 + 构建脚本 + 视频链接）；现	v1.0.0

周	日期	课程主题	波次	目标产出	版本
				场答辩 + 演示	

4. 当前状态

里程碑	计划完成	状态	备注
M0 仓库基建与调研	10-15	☒	开工前本人待办见 `kickoff-checklist.md`
W0：M1-3 接口冻结 / M1-1 需求 / C0 客户端底座	10-17 / 10-19 / 10-21	☒	10-16 全部合入
W1：原语与框架八条泳道	10-24	☒	10-16 全部合入，含复审修复
W2：遍历、过滤、容器、仓库、页面	10-28	☒	全部于 10-16 合入（M2-1、M2-2、M5-4、M6-2、C2），较计划提前约两周
W3：集成泳道（串行）	10-17	☒	10-16 全部合入：M2-5~M5-5 一个 PR（engine 全流水线），M6-3 全链路一个 PR，另有契约补遗 PR
W4：联调、打包、测试证据	10-18	☒	C3（#31）、C4（#35）已合入；M8-1~4 测试报告与全部证据成文（2026-10-17）；WSL 演示环境就绪（H10 ☒）
W5：文档定稿、PDF、视频	10-18（agent 侧）	☒	M9-1/9-3/9-4 已合入（#37）；

里程碑	计划完成	状态	备注
脚本			M9-2 仓库版 PDF+PPT 已生成待合入；提交版需本人学号与 H6/H7
M9-5/M9-6 发布与提交包	11-13 前	☒	M9-5 ☒（v1.0.0 已发布）；M9-6 待人工输入：H6 视频链接、平台地址/助教邮箱、真实学号——详单见 docs/project/human-tasks.md
人工任务包（H5/H6/H7/H8/H10）	10-18 后 ~ 11-13	☒	H10 已由 agent 代办完成（2026-10-17，WSL 24.04 工具链装齐）；其余代码冻结后即可开始，越早越好
H2 AI 训练证书（本人）	10-20	☒	审核需约 24h

5. 风险与缓冲

风险	影响	预案
考勤不满足 8/10	评分公式可能不生效	本人自行处理（10-16 起不再列入任务表）；剩余课次全勤（H9）
W3 六任务串行卡壳	冲刺顺延（最长链）	M2-5 最先开工；单点阻塞超半天就上报，必要时先交付无加密版、M5-5 最后接入
客户端联调问题	GUI 分与演示效果	客户端先用 mock 后

风险	影响	预案
		端开发；CLI 本身可独立演示兜底
WSLg/Electron 显示问题	演示环境	备选：Ubuntu 22.04 虚拟机桌面；C4b 便携包也可兜底课堂演示
人工任务集中到期（H1/H2/H6/H10）	提交物缺件	代码 10-18 冻结后立即启动；H6 视频链接阻塞 M9-6
文档与代码不一致	文档"一致性"失分	规范要求行为变更同 PR 改文档；M9-1 统一核对

6. 变更记录

日期	变更
2026-10-15	初版：后端选 Go、客户端选 Electron，按 10 次课倒排
2026-10-15	调研后改为波次 + 泳道并行；新增 C0 客户端底座；PDF 改为 11-12 一次性生成
2026-10-16	W0/W1/W2 全部合入，W2 较计划提前约两周；进入 W3 集成泳道节点
2026-10-16	开发改为 agent 两日冲刺：W3→W4→W5 于 10-16 晚 ~ 10-18 完成并功能冻结；课程节点、PDF 一次生成与提交截止不变
2026-10-17	H10 由 agent 代办完成：修复 install-deps.sh 在 Ubuntu 24.04 的虚拟包 bug 后，WSL 内装齐锁定版工具链；环境类问题此后一律 agent 处理（本人指示）
2026-10-17	v1.0.0 发布（本人授权 agent 推 tag）；新增 docs/project/human-tasks.md 剩余人工任务详单；README 更新为发布后状态

日期	变更
2026-10-17	W4 全部完成：C3/C4 合入，M8-1~4 测试报告成文（覆盖率/race/fuzz/静态检查/性能全绿）；进入 W5 收尾
2026-10-18	收尾复核：重做客户端截图（真实后端）与答辩 PPT（14 页，去宣传式表述）；复核截图时发现并修复 Tailwind v4 扫描范围导致的 Sheet/对话框样式缺陷，重建 8 张 e2e 基线；human-tasks 增补 H11（是否发 v1.0.1）与 H12（提交版 PDF/PPT 重出）
2026-10-18	截图基线改为自动审计（结构契约 + visual-audit + 盖章）；发布 v1.0.1：修复版产物、基线/截图/PPT/PDF 全部重出，Windows 便携包重建并随 Release 上传
