项目进度计划

数据备份软件（DataBackup）

组长: 待填写
学号: 待填写

目录

项目进度计划.....1

1. 关键日期.....1

2. 甘特图.....2

3. 周计划.....2

4. 当前状态.....3

5. 风险与缓冲.....4

6. 变更记录.....5

项目进度计划


基准日：2026-10-15（第 5 周周四）。课次日期按"每周一上课"推算⚠，以实际课表为准；课表确认后更新本表与甘特图。 维护规则：任务状态以 `../roadmap.md` 为准；每完成一个里程碑或计划变动时更新本文 §4 状态表与 §5 变更记录，并在里程碑发布时重建 PDF。

1. 关键日期

日期	事件
2026-10-19（周一）	第 6 次课；v0.1.0（需求 + 设计 + 框架代码）
2026-10-26（周一）	第 7 次课
2026-11-02（周一）	第 8 次课
2026-11-09（周一）	第 9 次课
2026-11-12（周四）	v1.0.0 冻结：功能、文档、PPT、视频全部完成
2026-11-13（周五）	提交（预留 2 个工作日缓冲）
2026-11-16（周一）	**第 10 次课：提交截止 + 答辩 + 演**

日期	事件
	示

2. 甘特图

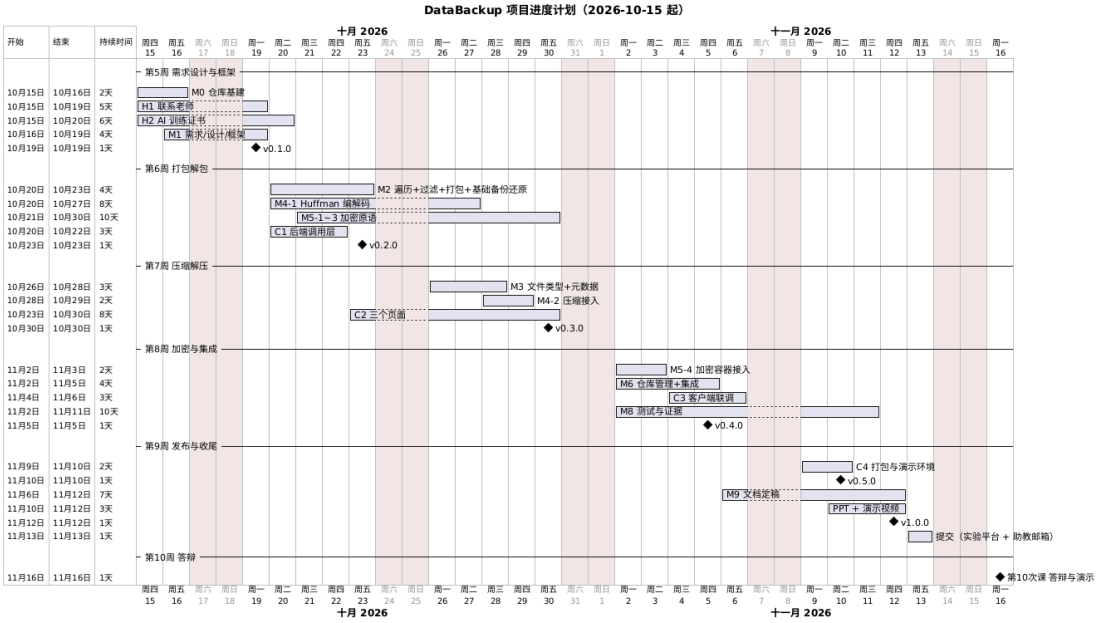

（源文件 `diagrams/schedule-gantt.puml`，由 `bash scripts/docker.sh docs` 渲染。）

3. 周计划

周	日期	课程主题	目标产出	版本
第 5 周	10-12 ~ 10-18	需求设计与程序框架	M0 仓库基建；M1 需求分析说明书、系统设计文档初稿、CLI 协议冻结、框架代码与构建脚本；H1 联系老师、H2 启动 AI 证书	v0.1.0（10-19）
第 6 周	10-19 ~ 10-25	打包解包	M2 遍历、过滤、MyPac	v0.2.0（10-23）

周	日期	课程主题	目标产出	版本
			k、基础备份还原；并行启动 M4 Huffman、M5 加密原语、C1 客户端调用层	
第 7 周	10-26 ~ 11-01	压缩解压	M3 文件类型与元数据；M4 压缩接入；C2 客户端三个页面（mock 后端）	v0.3.0（10-30）
第 8 周	11-02 ~ 11-08	加密解密与系统集成	M5 加密接入；M6 仓库管理与全链路集成；C3 客户端联调；M8 测试证据开始	v0.4.0（11-05）
第 9 周	11-09 ~ 11-15	软件发布与项目收尾	C4 打包与 WSL 演示；M8 收尾；M9 文档定稿、PPT、视频、发布、提交	v0.5.0（11-10）→ v1.0.0（11-12）
第 10 周	11-16	项目答辩与成果展示	现场答辩 10 分 + 演示 20 分	—

4. 当前状态

里程碑	计划完成	状态	备注
M0 仓库基建	10-16	☒	
M1 需求/设计/	10-19	☒	

里程碑	计划完成	状态	备注
框架			
M2 遍历+过滤+打包	10-23	☒	
M3 文件类型+元数据	10-28	☒	
M4 压缩	10-29	☒	
M5 加密	11-03	☒	
M6 集成	11-05	☒	
C 客户端	11-10	☒	
M8 测试证据	11-11	☒	
M9 文档/发布/提交	11-13	☒	
H1 联系老师	10-19	☒	决定评分公式是否生效，最高优先级
H2 AI 训练证书	10-20	☒	审核需约 24h

5. 风险与缓冲

风险	影响	预案
考勤不满足 8/10	评分公式可能不生效	H1 最高优先级；剩余课次全勤
加密/压缩实现超期	推迟集成	M4/M5 纯算法模块在第 6 周即并行启动；真到不了就先交付无加密版本，加密作为最后接入
客户端联调问题	GUI 分与演示效果	客户端先用 mock 后端开发；CLI 本身可独立演示兜底
WSLg/Electron 显示问题	演示环境	备选：Ubuntu 22.04 虚拟机桌面
文档与代码不一致	文档"一致性"失分	规范要求行为变更同 PR 改文档；M9-1 统一核对

6. 变更记录

日期	变更
2026-10-15	初版：后端选 Go、客户端选 Electron，按 10 次课倒排
